



Statens vegvesen



Status Belønningsordning

Oktober 2018



Prosjektnr. 504778

Kollektivfelt fv. 63

- Etablering av kollektivfeltet skal gi bedre fremkommelighet for buss på Langnes.
- Prosjektet ble åpnet 5.oktober. Roald Madsen AS har hatt hovedentreprisen og har gjennomført kontraktsarbeidet på en faglig god måte.
- Gjenstår mengderegulering og sluttoppstilling.
- Prognosen redusert med 2 mill. Omdisponert til veglys Eidkjosen

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	8 379
Regnskap hiå	7 482
Entreprenørfaktura hittil:	6 952
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	530
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	5 102 663






Prosjektnr. 504828

Innfartsparkering Storelva

- Etablering av innfartsparkering legger til rette for at flere skal reise kollektivt.
- For at prosjektet skal realiseres må det fremmes en mindre reguleringsplanendring. Statens vegvesen lager R-tegning.
- Mini konkurranse utlyst for avretting av areal og klargjøring for asfaltering som utføres i 2018.
- I 2019 asfalteres arealet. I tillegg etableres ny avkjøring og belysning.

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	600
Regnskap hiå	235
Entreprenørfaktura hittil:	
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	235
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	

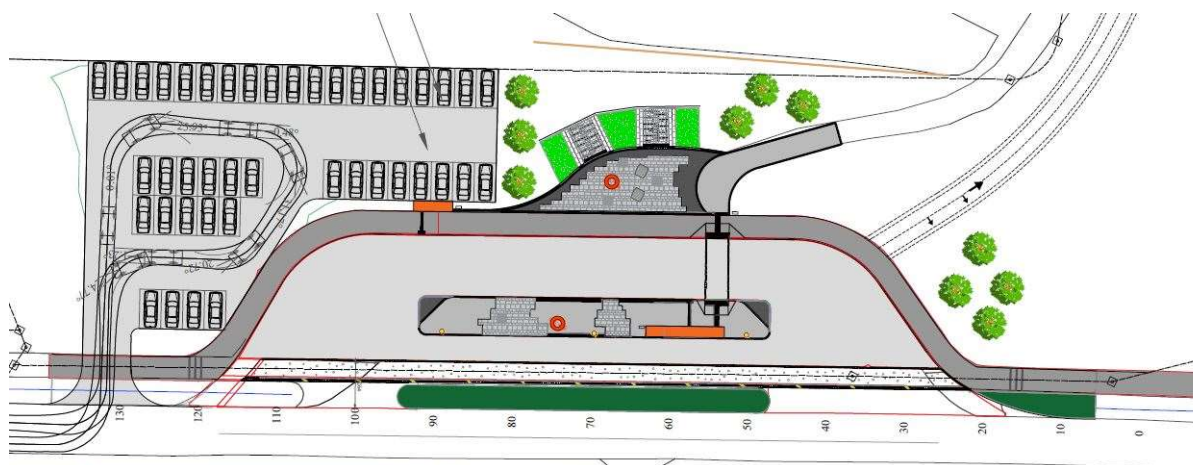



Prosjektnr. 504893

Kollektivfelt kommunal veg Kvaløyveien

- Prosjektet blir ikke gjennomført i år. Prosjektet er etter avtale med fylkeskommunen i møte 9.3.18 foreslått omdisponert til andre tiltak i belønningsordningen. Prosjektet settes derfor med null i prognose og inaktivt så snart endringsmelding foreligger.

Prognose for året:	0
Regnskap hiå	0
Entreprenørfaktura hittil:	
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	0
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	



Prosjektnr. 504309

Framkommelighet for buss på Langnes og Breivika

- Glassmester Eriksen AS er ferdig med utskifting av glassfasade. Arbeidet ble ferdig innen tidsfristen, 30.05.2018. Slutfaktura er mottatt og attestert.

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	300
Regnskap hiå	288
Entreprenørfaktura hittil:	204
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	84
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	163 311,81






Prosjektnr. 504746

Fv. 862 Veglys Eidkjosen – Kaldfjord

- Etablering av nye veglys vil gi bedre belysning på en strekning hvor det er sammenblanding av myke og harde trafikanter.
- Det er inngått kontrakt med Nettpartner AS om etablering av nye veglys på strekningen. Arbeidet er godt i gang og man håper grøftearbeidet er ferdigstilt før vinteren.
- Prognosen økt med 2 mill. Omdisponert fra kollektivfelt fv 63

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	7 365
Regnskap hiå	179
Entreprenørfaktura hittil:	0
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	140
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	4 078 701,64

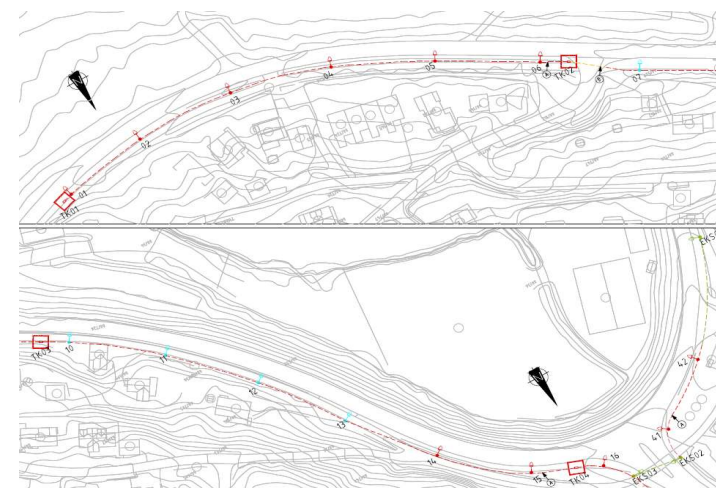




Prosjektnr. 504918

Bussprioritering i Hansjordnesbukta

- Frist for ferdigstillelse er satt til 01.10.18. Landskapsentreprenør A. Markussen skal gjøre nødvendige tiltak på trafikkøyer. Bydrift skilter trafikkøyer i samråd med Statens vegvesen. Bydrift merker det kommunale vegnettet. Statens vegvesen merker og skilter innenfor sitt ansvarsområde. SVV ivaretar byggekontrollen på trafikkøylene. Tromsø kommune viderefakturerer til SVV etter ferdigstillelse. A. Markussen kom sent i gang, men starter arbeidet i uke 43. Arbeidet er anslått å ta ca. 1 uke avhengig av været.

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	1 000
Regnskap hiå	43
Entreprenørfaktura hittil:	0
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	43
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	

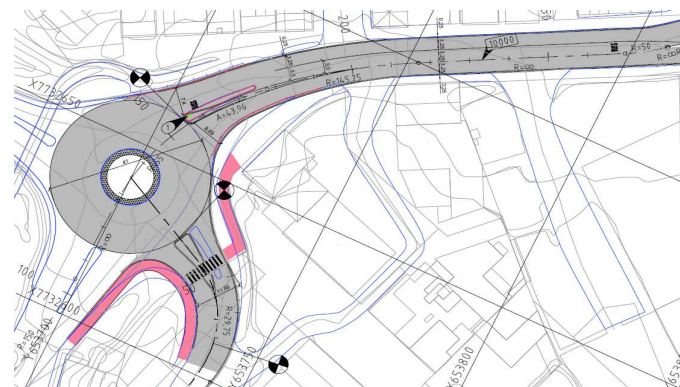



Statens vegvesen

Prosjektnr. 504919

Utvidelse bybussområdet til «Tromsøsvingen»

- Målet er blant annet å betjene planlagte nye boliger på strekningen i tillegg til utvidelse av bybusstilbudet.
- Prosjektgruppe etablert. Forberedelse planoppstart pågår.

Prognose for året:	600
Regnskap hiå	77
Entreprenørfaktura hittil:	0
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	77
Kontraktssum entreprenør eks. mva:	





Prosjektnr. 504888

Fv. 862 kollektivløsning Sandnessundbrua- Eidkjosen

- Målet er å få etablert et så godt busstilbud at Tromsø innbyggere velger kollektivt på to av 10 daglige reiser.
- Efla skal utrede kollektivløsning. Oppstart juni 18 med ferdigstillelse i år.

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	500
Regnskap hiå	170
Entreprenørfaktura hittil:	0
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	170
Kontraktssum utredning eks. mva:	300





Statens vegvesen



Prosjektnr. 504559 Administrasjon

- Gjelder lønnskostnader for prosjektgruppen internt i SVV.

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	600
Regnskap hiå	398
Entreprenørfaktura hittil:	0
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	398
Kontraktssum utredning eks. mva:	



Prosjektnr. 504314

Planlegge terminal Giæverbukta

- Arbeidet er tatt i plan for nytt kryss 862 på Tverrforbindelsen. Det er planlagt varslet oppstart i okt.

Tall i 1000-kr

Prognose for året:	1 000
Regnskap hiå	87
Entreprenørfaktura hittil:	0
Byggherrekostnad hittil prosjektering:	87
Kontraktssum utredning eks. mva:	
